


# DARBA AIZSARDZĪBAS PLĀNS

Būvprojekta „Prohorova ielas pārbūve, Jelgavā” „Darbu aizsardzības plāns” izstrādāts saskaņā ar MK noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, IV daļu „Darba aizsardzības plāns”.

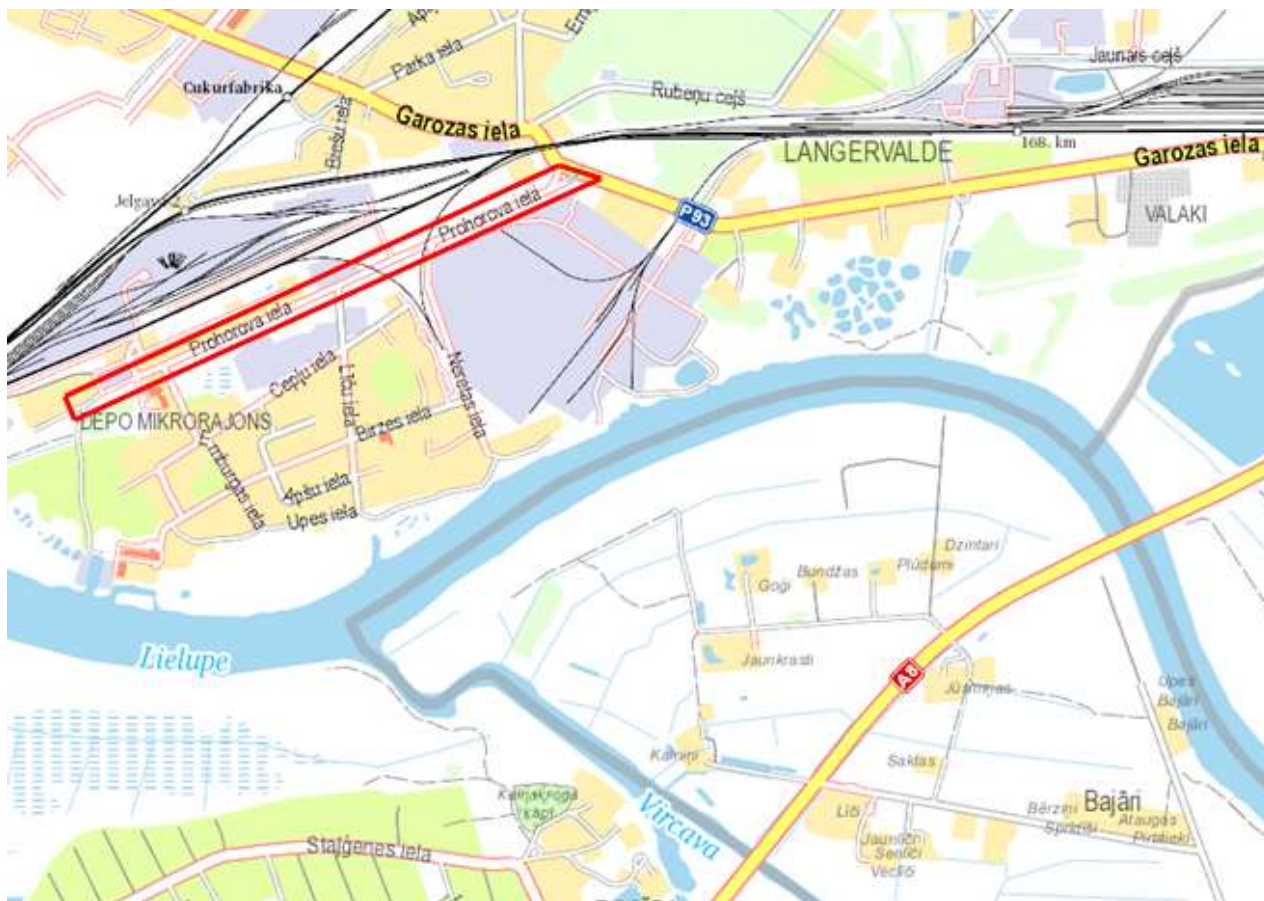

1. Att. Projektētās ielas ģeogrāfiskais novietojums.

Prohorova iela atrodas Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā. Ielai piegulošajos īpašumos atrodas bijušās Jelgavas dzelzsbetona rūpnīcas teritorija, tagadējā SIA „Lielupes industriālais parks” teritorija, dzelzceļa sliežu ceļu teritorija un dzīvojamās ēkas. Prohorova ielas galā atrodas neapgūtas plavas, kurās plānojas rūpnieciskā apbūve.

Būvdarbu laikā jānodrošina piekļūšana zemes īpašumiem.

Visi satiksmes organizācijas un darbavietas tehniskie līdzekļi jāuzstāda ne ātrāk kā vienu dienu pirms darba uzsākšanas un jānoņem tūlīt pēc darba pabeigšanas.

Būvprojektā paredzētie pārbūves darbi ir saistīti ar ceļu un komunikāciju standarta ikdienas darbiem un materiāliem, neparedzot nekādus īpašus darbu veidus vai materiālu pielietojumu.

### ***Informācija par paredzētā būvlaukuma teritoriju:***

- būvdarbu laikā jānodrošina piekļūšana zemes īpašumiem;
- visi satiksmes organizācijas un darbavietas tehniskie līdzekļi jāuzstāda ne ātrāk kā vienu dienu pirms darba uzsākšanas un jānoņem tūlīt pēc darba pabeigšanas, būvprojektā nav paredzētas pagaidu būves;
- nederīgās gruntis norokot transportējamās uz Pasūtītāja vai Būvuzņēmēja (ja Pasūtītājs atzina materiālu par tam nederīgu) atbērtni, būvmateriāli nelielos apjomos novietojami būvdarbu zonā, vai uzreiz izbūvējami;
- Būvuzņēmējs izstrādā satiksmes organizācijas shēmas būvdarbu laikam, uzrāda kā tiks nodrošināta piekļuve īpašumiem un uzņēmumiem.

Būvdarbu laikā Būvuzņēmējs veic būvlaukumā veicamo darba aizsardzības pasākumu saskaņošanu un attiecīgās informācijas apmaiņu starp Pasūtītāju, Projekta vadītāju, Galveno būvdarbu veicēju, atsevišķu būvdarbu veicējiem un pašnodarbinātajiem, u.c. personālu.

### ***Būvdarbu laikā ar darba drošību saistītie jautājumi:***

- par darba drošības tehniku un darba aizsardzību būvlaukumā ir atbildīgs Būvuzņēmējs. Būvdarbu veicējam jāieceļ par darba aizsardzību un drošību atbildīga persona un jāieraksta šīs personas vārds, uzvārds un kontaktkoordinātes būvdarbu žurnālā, kā arī jāievēro visas "ceļu specifikācijas 2017" un citu būvnormatīvu un normatīvu prasības;
- nepieciešams nodrošināt transportlīdzekļu, gājēju un darbinieku drošu pārvietošanos būvobjektā;
- pirms būvdarbu uzsākšanas būvobjektā, nepieciešams instruēt visus nodarbinātos par darba aizsardzības prasībām, individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanas nepieciešamību un sekām, kādas var rasties tos nelietojot;
- atrodoties būvlaukumā strādniekiem jābūt darba apģērbā un apavos, kā arī jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi kā aizsargbrilles, troksni slāpējošas austiņas, drošības jostas u.c. pārliedzinoties, ka darbiniekiem tiks nodarīts pēc iespējas mazāks kaitējums, kas saistās ar arodslimībām;
- jāpārliedzinās, ka visas darbavietas būvbedrēs ir atbilstoši nostiprinātas (gruntij atbilstoši nogāzes slīpumi, atbilstoši vairogi, atbilstošas rievsienu), pietiekoši sausas, stabilas un noturīgas, bez grunts u.c. priekšmetu nogrūvuma iespējām. Veicot darbavietas pārvietošanu ir atkārtoti jāpārliedzinās vai iepriekš minētie nosacījumi izpildās. Būvbedrēm jābūt norobežotām un labi saskatāmām visiem, kas atrodas būvlaukumā;

- jāpārliciecinās, ka visas darbavietas augstumā ir stingas, stabilas un noturīgas, bez iespējām no tām nokrist. Veicot darbavietas pārvietošanu ir atkārtoti jāpārliciecinās vai iepriekš minētie nosacījumi izpildās;
- visām elektroinstalācijām un izmantojamām ierīcēm jābūt tehniskā kārtībā un tām jāveic regulāras pārbaudes;
- visām izmantotajām iekārtām, un tehniskajiem līdzekļiem jāatbilst Eiropas standartiem;
- aizliegts izmantot bojātas ierīces un savienojumus, kā arī bojātus aizsardzības līdzekļus;
- pārliecināties, lai visas pagaidu konstrukcijas, tajā skaitā būvmateriālu krāvumi, tiktu veidoti stabili, bez iespējas apgāzties;
- demontējot konstrukcijas, nodrošināt nepieciešamos drošības pasākumus, izmantojot piemērotas darba tehnoloģijas;
- būvlaukumā vienmēr ir jābūt pieejamai pirmās medicīniskās palīdzības aptieciņai, ko nepieciešamības gadījumā varētu ātri atrast un prasmīgi izmantot;
- personām, kuras nav saistītas ar konkrēto būvobjektu, atrasties būvlaukumā stingri aizliegts.

Pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt Darba aizsardzības plānu saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.

***Būvdarbu laikā paaugstināta uzmanība nodarbināto drošībai un veselībai ir jāpievērš:***

- apbēršana ar grunti zemes nogrūvumos – būvbedres nostiprināšanai jālieto pārvietojamie inventāra vairogi;
- applūdināšana ar ūdeni – būvbedres nosusināšanai lietojamas ūdens pazemināšanas iekārtas, nepieciešamības gadījumā dubļu sūkņi;
- nokrišana no 1,5 m un lielāka augstuma – būvbedres nostiprināšanai jālieto pārvietojamie inventāra vairogi, iekāpšanai būvbedrē lietojamas attiecīgi piemērotas, rūpnieciski ražotas pārvietojamās kāpnes;
- iegrimšana nestabilā gruntī – būvprojekta izstrādes laikā netika iegūta informācija, ka būvobjektā varētu būt tik nestabilas gruntis, ka būtu iespējama iegrimšana, ja vien esošās gruntis netiek pārmitrinātas. Pārmitrinātām un vājas nestspējas gruntīm ar iegrimšanas pazīmēm obligāti pielietojamas ūdens pazemināšanas iekārtas, inventāra vairogi un gruntis norokamas no esošā laukuma stabilās virsmas, nomainot ar atbilstošām gruntīm;
- būvdarbos nav paredzēti darbi, kuros nodarbinātie nonāk saskarē ar kaitīgām ķīmiskām vai bioloģiskām vielām, kas rada risku nodarbināto drošībai un veselībai vai saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir pakļautas speciālai uzraudzībai;

- būvdarbos nav paredzēti darbi, kuros nodarbinātie ir pakļauti apstarošanas riskam ar jonizējošo starojumu un kuru izpildi reglamentē normatīvie akti par aizsardzību pret radiāciju;
- pazemē (piemēram, akās, tuneļos) veicamie darbi – akas, kas ir dziļākas par 1,8m (objektā ir līdz 2,15m) tiek paredzēts aprīkot ar atbilstošām, rūpnieciski izgatavotām kāpnēm, darbs akā ir pielietojot aizsargķiveri u.c. individuālos aizsardzības līdzekļus;
- būvdarbos nav paredzēti darbi, kuros nodarbinātajiem nepieciešama gaisa piegādes sistēma;
- būvdarbos nav paredzēti darbi, kuros nodarbinātie pakļauti paaugstinātam atmosfēras spiedienam (piemēram, kesonos);
- būvdarbos nav paredzēti spridzināšanas darbi;
- darbiem, kas saistīti ar būvju, būvkonstrukciju, būvelementu vai iekārtu montāžu, demontāžu vai nojaukšanu – virszemes ūdens uztvērēj aku un caurteku montāžas laikā, ievērojamas darba drošības prasības darbam ar paceļamām iekārtām un montāžas darbiem.

Būvprojekta vadītājs

Aigars Buķevics
